



Beter gekeurd

Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Oost-Vlaanderen, Industriepark - Zwijnaarde 3B, 9052
ZWIJNAARDE
T: 09 252 45 45, E: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0381-200217-05

Datum van het onderzoek: 17/02/2020

Extra controledatums:

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE:

DENDERMONDESTEEENWEG 527
9070 DESTELBERGEN

EIGENAAR:

Adres: DENDERMONDESTEEENWEG 527
9070 DESTELBERGEN

OPDRACHTGEVER:

VANDER MINNEN LUC
Adres: MARKIESSTRAAT 66
9070 DESTELBERGEN

INSTALLATEUR:

VANDER MINNEN LUC
Adres: MARKIESSTRAAT 66
9070 DESTELBERGEN

Visualisatie van de installatie



BTW of IK:

EAN: 541448820041823420

Teller nr. 5268927

Index: 49379

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie:	Type der lokalen:	Appartement
Begin werken fundering: Voor 01/10/1981	Elektrische installatie:	Na 01/10/1981
Aansluiting spanning: 3x400V + N	AREI art.:	86
Voedingskabel hoofdbord: XVB 4 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting:	63 A
Type van de aardelektrode: Baren	Alg. schakelaar: type:	4p 63A/300mA
Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen:	18
Uitwendige invloedsfactoren:	Schema:	TT

VMA - 49
MA-LS-02/2015



1 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ONDERZOEK:

Onderzoek volgens: AREI art. 271
Aard van het onderzoek: Controlebezoek

METINGEN:

RA: 11 Ohm RI tot.: 50 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadschema's en situatieplannen.

VASTGESTELDE INBREUKEN:

Geen

NOTA'S:

- 1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
- 2 De toestellen zijn nog niet geplaatst.

BESLUIT:

De installatie is conform.
De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.
De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17/02/2045 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0381 SVEN CLAUWAERT

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271):

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de fouttussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1;
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

VMA - 49

Verslagnummer 0381-200217-05



2 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 17/02/2045.

STAP 4

BTV Oost-Vlaanderen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.



VMA - 49

Verslagnummer 0381-200217-05



3 / 3


DE KRINGWINKEL OPEN PLAATS
DENDERMONDSESTEENWEG 527
9070 DESTELBERGEN
ZEKERINGKAST APPARTEMENT

Vander Minnen bvba
Markiesstraat 66
9070 Destelbergen



- A STOPCONTACTEN KEUKEN + LIVING
- B STOPCONTACTEN SLAAPKAMER 3
- C CV
- D STOPCONTACTEN SLAAPKAMER 5
- E STOPCONTACTEN SLAAPKAMER 4
- F STOPCONTACTEN LIVING + SLAAPKAMER 2
- G STOPCONTACTEN KEUKEN + LIVING
- H STOPCONTACTEN KEUKEN KANT DAMPKAP
- I STOPCONTACT VAATWAS KEUKEN
- J STOPCONTACT BOILER KEUKEN
- K STOPCONTACTEN BERGING KEUKEN EN TERRAS
- L STOPCONTACTEN SLAAPKAMER 1 EN BADKAMER
- M STOPCONTACT BERGING KEUKEN
- N VERLICHTING BADKAMER + SLAAPKAMER 1&2
- O VERLICHTING TWEEDE VERDIEPING
- P VERLICHTING TRAP + TRAPHAL
- Q VERLICHTING LIVING + KEUKEN + BERGING
- R KOOKPLAAT

EENDRAADSCHEMA APPARTEMENT

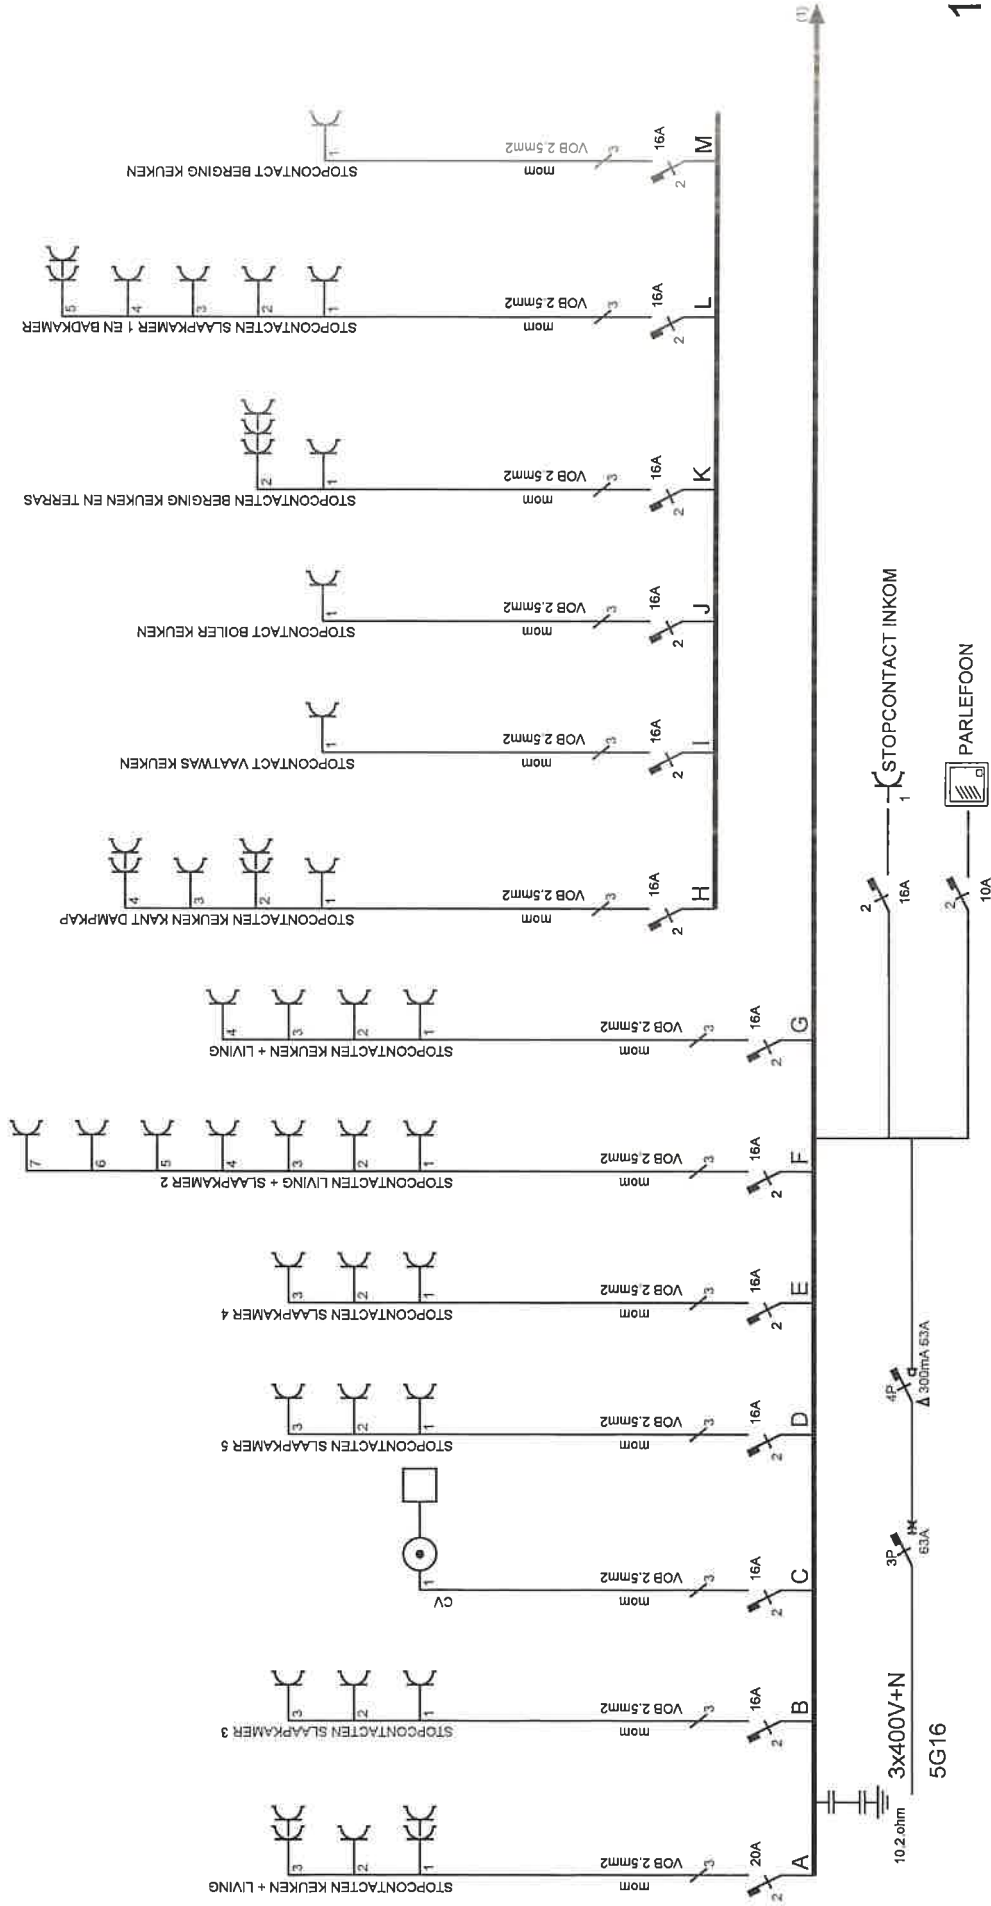


1/2

Aafgev. erkend organisme 17 / 02 / 2020	Eigenaar DE KRINGWINKEL OPEN PLAATS DENDERMONDSESTEENWEG 527 9070 DESTELBERGEN ZEKERINGKAST APPARTEMENT	Verantw. uitvoering 17 / 02 / 2020	Vander Minnen bvba Markiesstraat 66 9070 Destelbergen BE 0462.209.453
---	---	--	--

BTv
Sven Clauwaert
381



EENDRAADSCHEMA APPARTEMENT

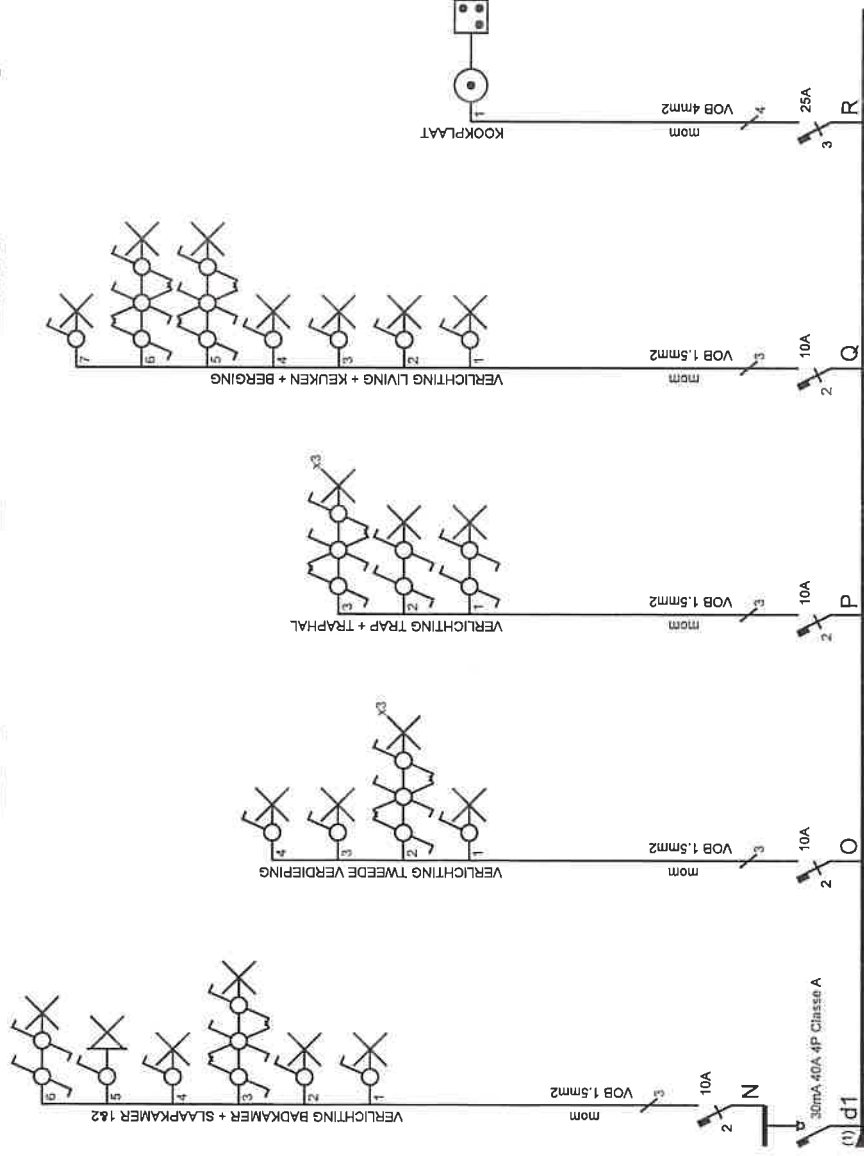

2/2

Afgev. erkend organisme 17 / 02 / 2020 BTV Sven Clauwaert 381	Eigenaar DE KRINGWINKEL OPEN PLAATS DENDERMONDSESTEENWEG 527 9070 DESTELBERGEN ZEKERINGKAST APPARTEMENT	Verantw. uitvoering 17 / 02 / 2020 	Vander Minnen bvba Markiesstraat 66 9070 Destelbergen BE 0462.209.453
---	---	---	--

APPARTEMENT

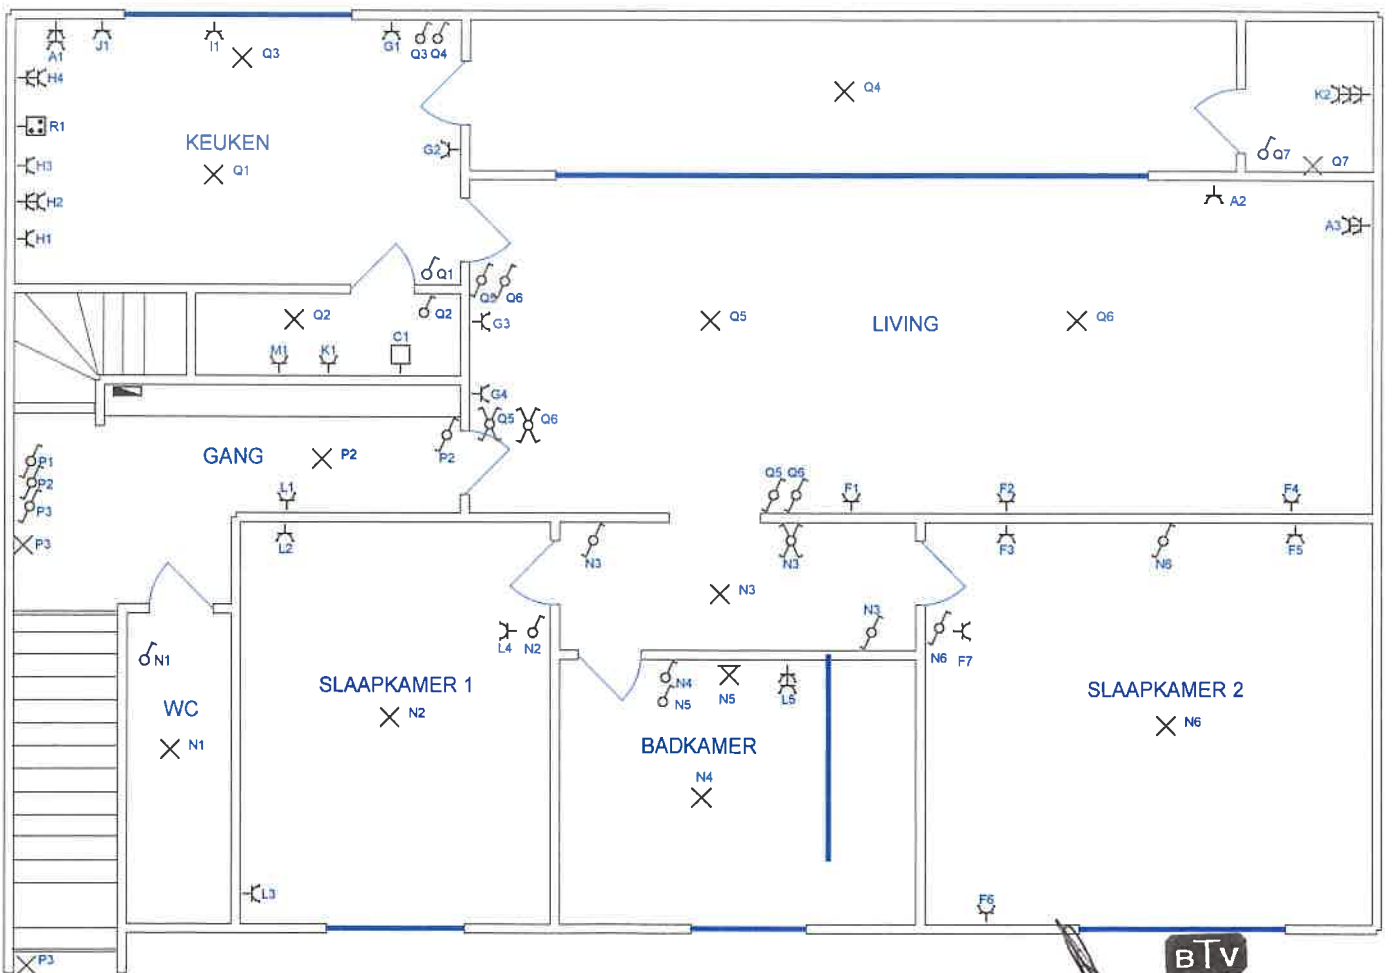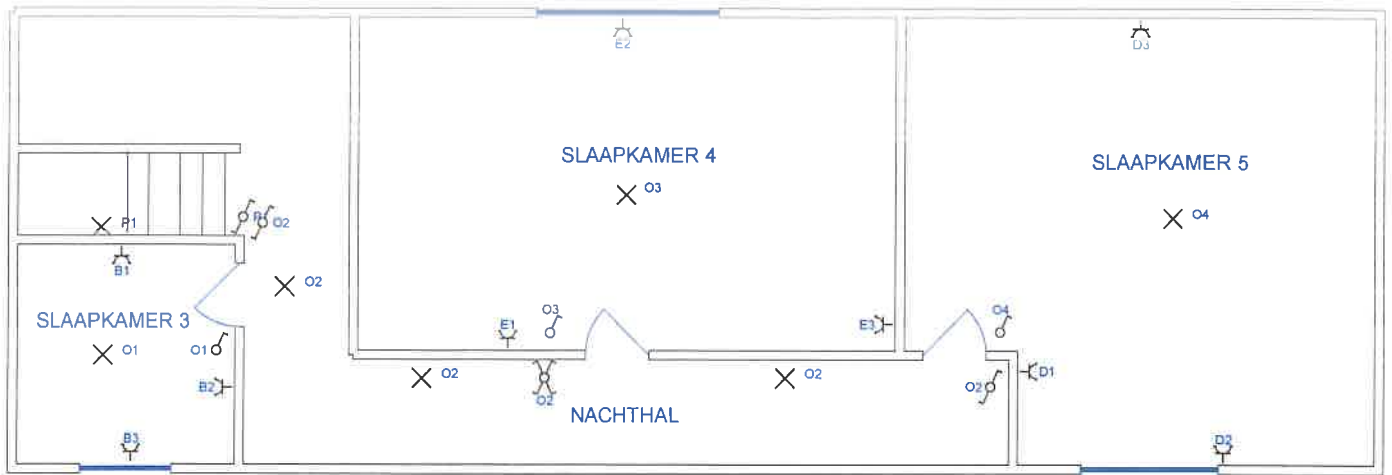

BTV

Sven Clauwaert
381
