



ACEG

Erkend keuringsorganisme

vzw

Ringlaan 39

1853 - Strombeek-Bever

tel. +32 2 880 88 90

info@aceg.be

www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 09/09/2024

ID-label: 001

Inspecteur: Jean Francois Steux

B.T.W. nr.:BE 0527 969 812

Mentor:

Klantreferentie:

Installateur: Ver Eecke Bart

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 18460151

Datum verslag: 18/09/2024

Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Kortrijksesteenweg	Naam	Niet gekend
Huisnummer	773	Straatnaam	Kortrijksesteenweg
Busnummer	0001	Huisnummer	773
Postcode	9000	Busnummer	0001
Gemeente	Gent	Postcode	9000
Land	België	Gemeente	Gent
		Land	België
		Installateur	
		Naam	Ver Eecke Bart
		BTW nr.	BE 0527 969 812
		Telefoonnummer	+32 479 64 72 35
		E-mail	info@bartvereecke.com

Type : appartement

EAN : 54
☒ Niet meegedeeld

Teller Nr.: : Nog te plaatsen

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Aardingslus

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Nee

Spanning: 3N400V

Aantal kringen: 16

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 0,598 MΩ

RE: 1,83 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	10		2	1,5
9	C	20		2	2,5
1	C	25		2	4
1	C	25		4	4
3	C	16		2	2,5
1	C	16		2	1,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	in afwachting	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
- nota/note 22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.
- nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
- nota/note 37 Toestellen niet geplaatst op moment van controle. Maximaal vermogen kon niet worden nagekeken ter bepaling van het gebruik van de kring (Boek 1 onderafdeling 5.2.1.2.)
- nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
- nota/note 9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 9/9/2049
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG


De inspecteur Jean Francois Steux


Jean-Francois Steux


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 9/9/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

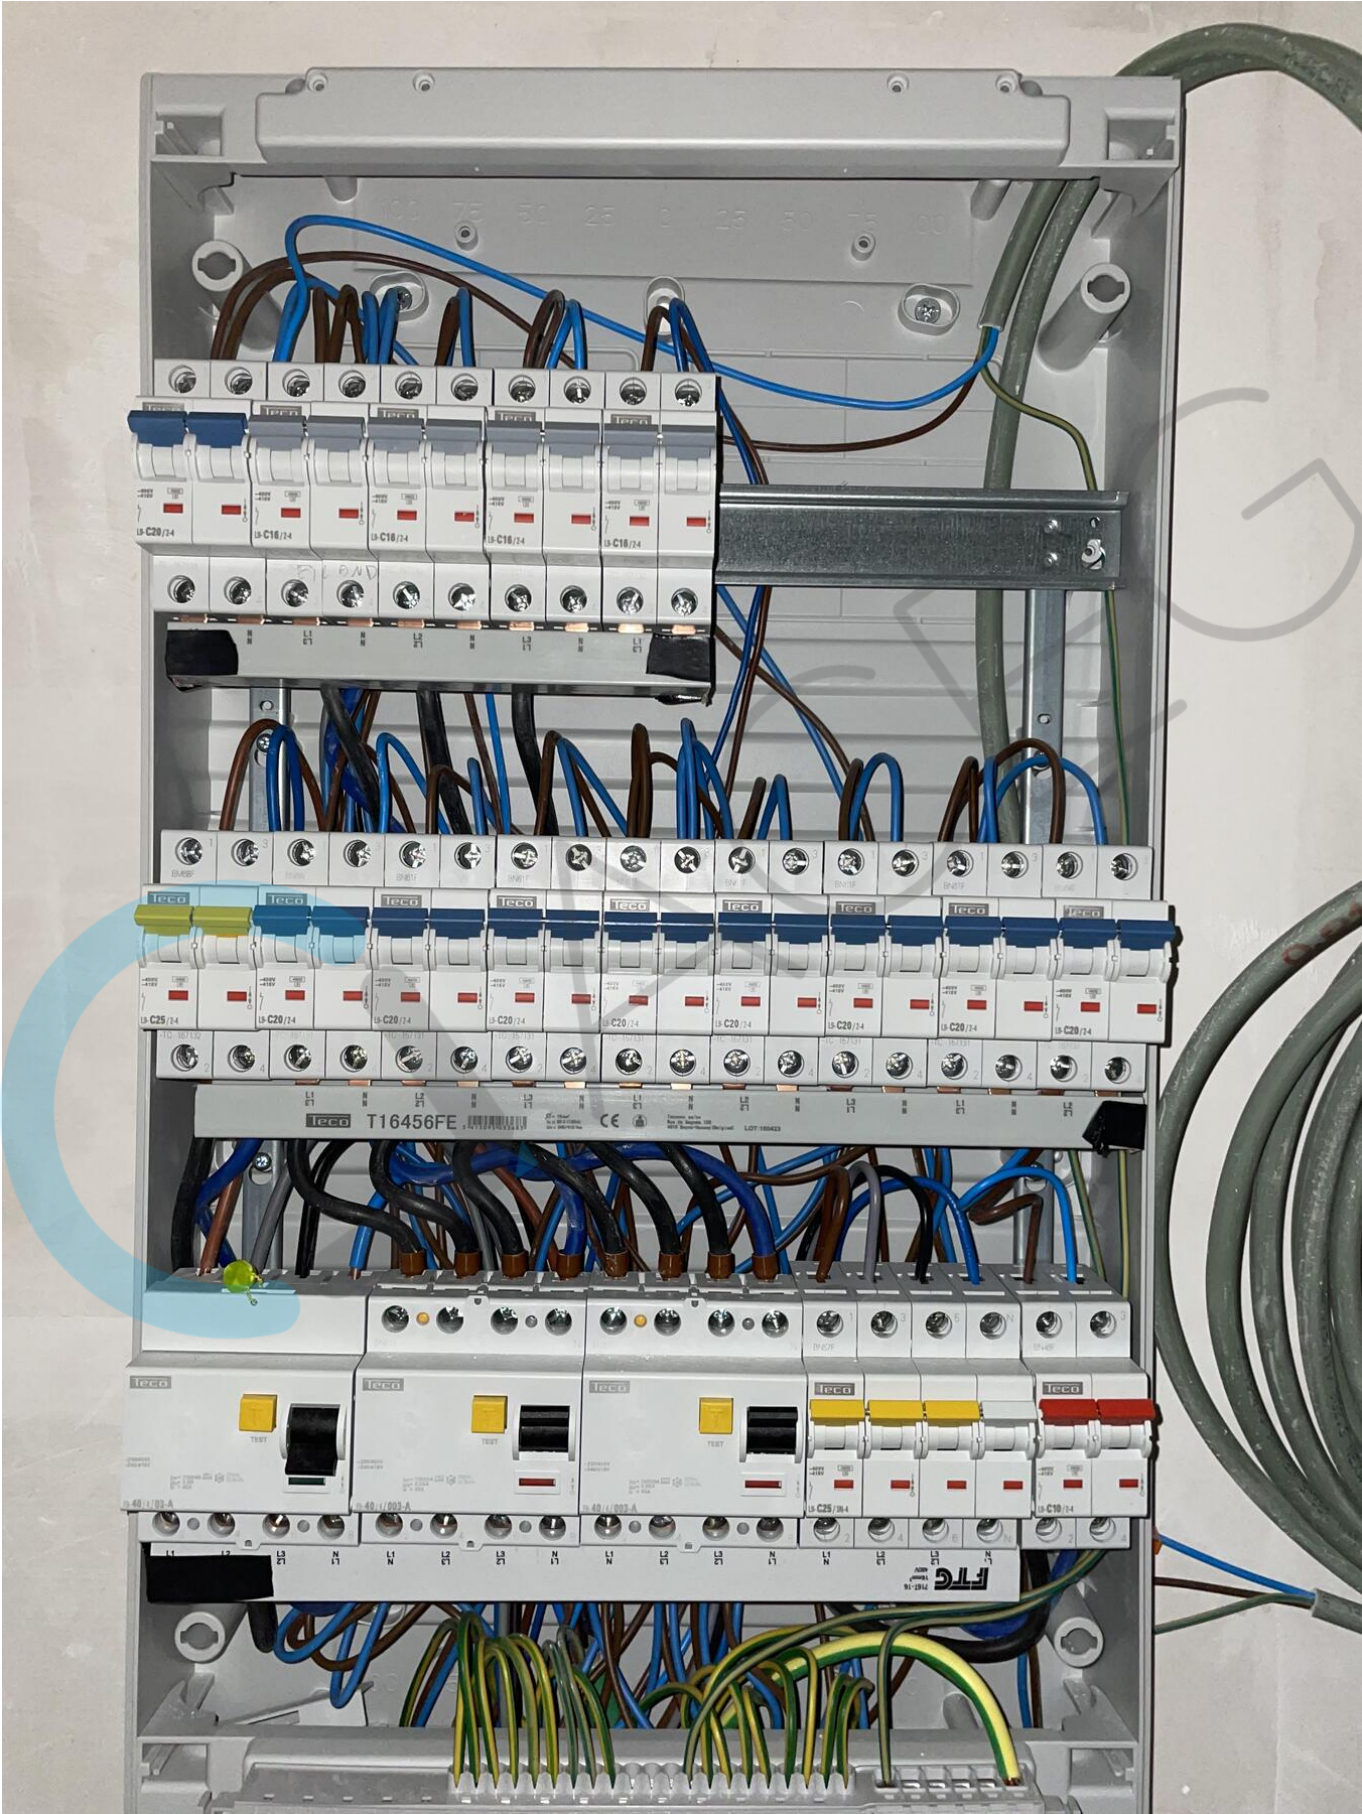




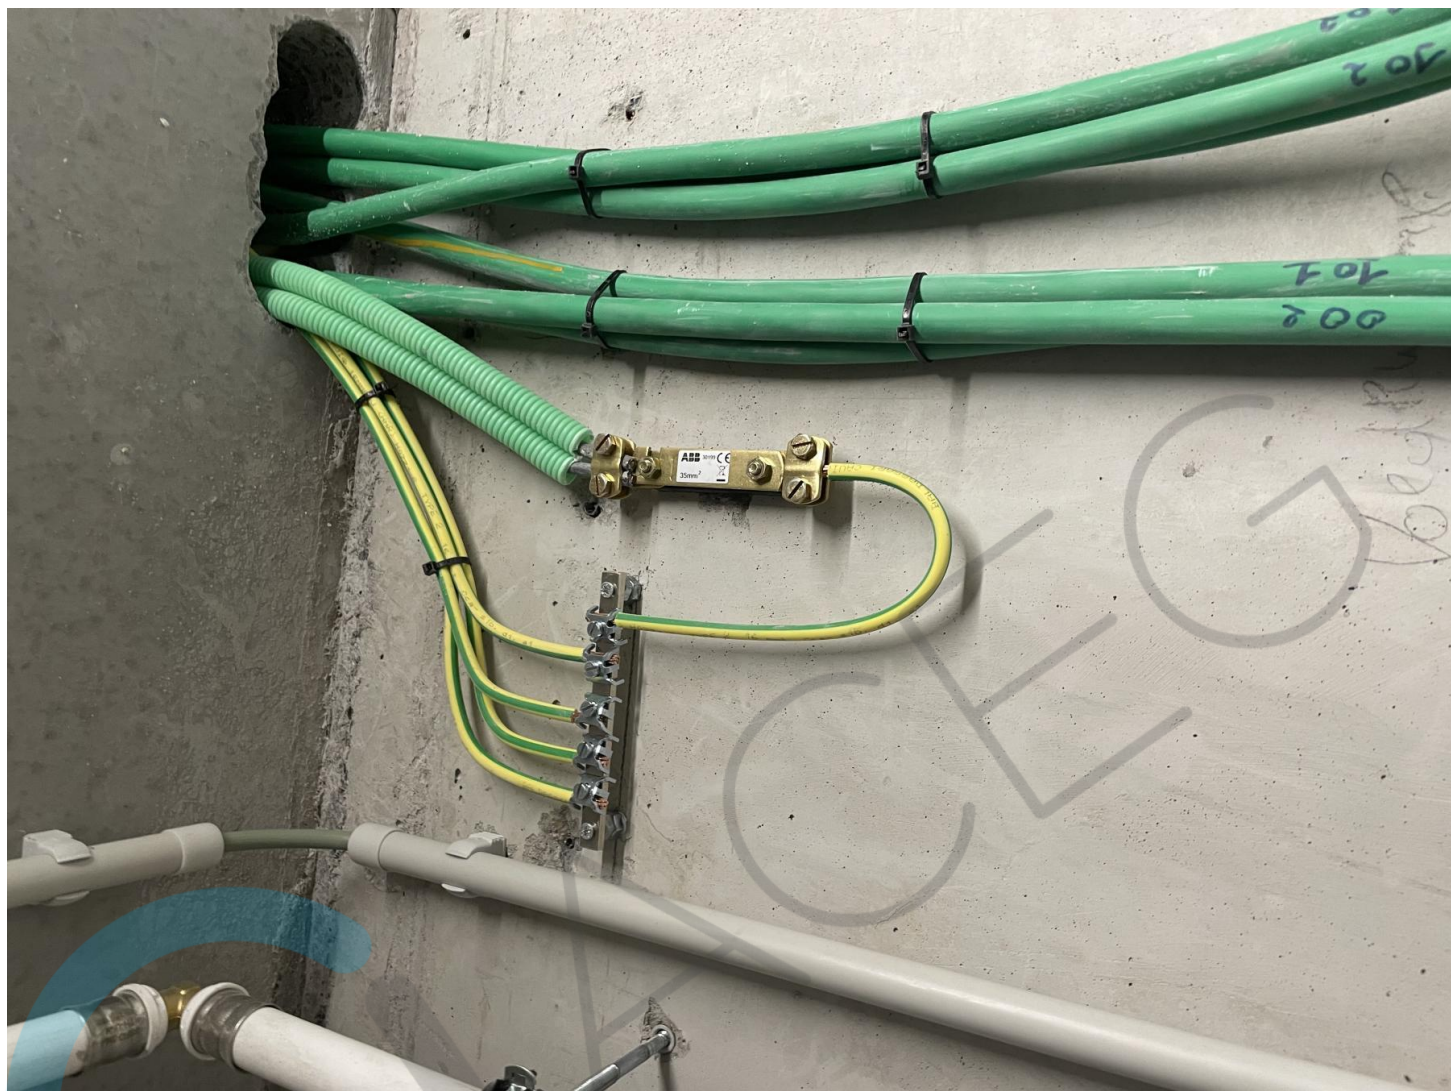

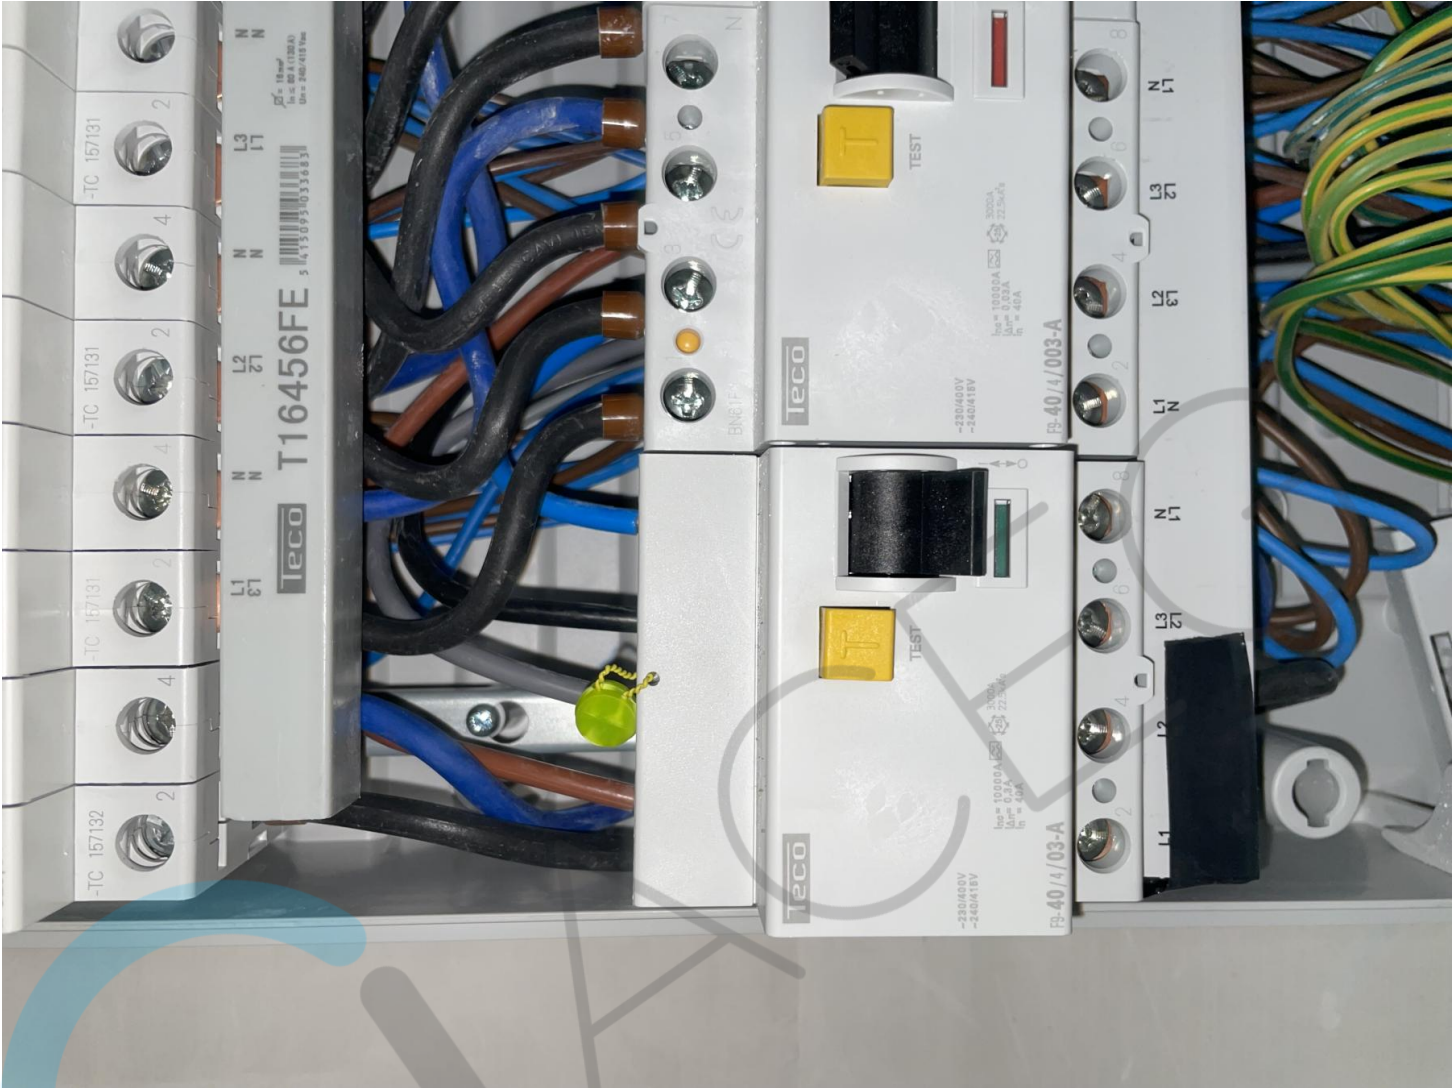



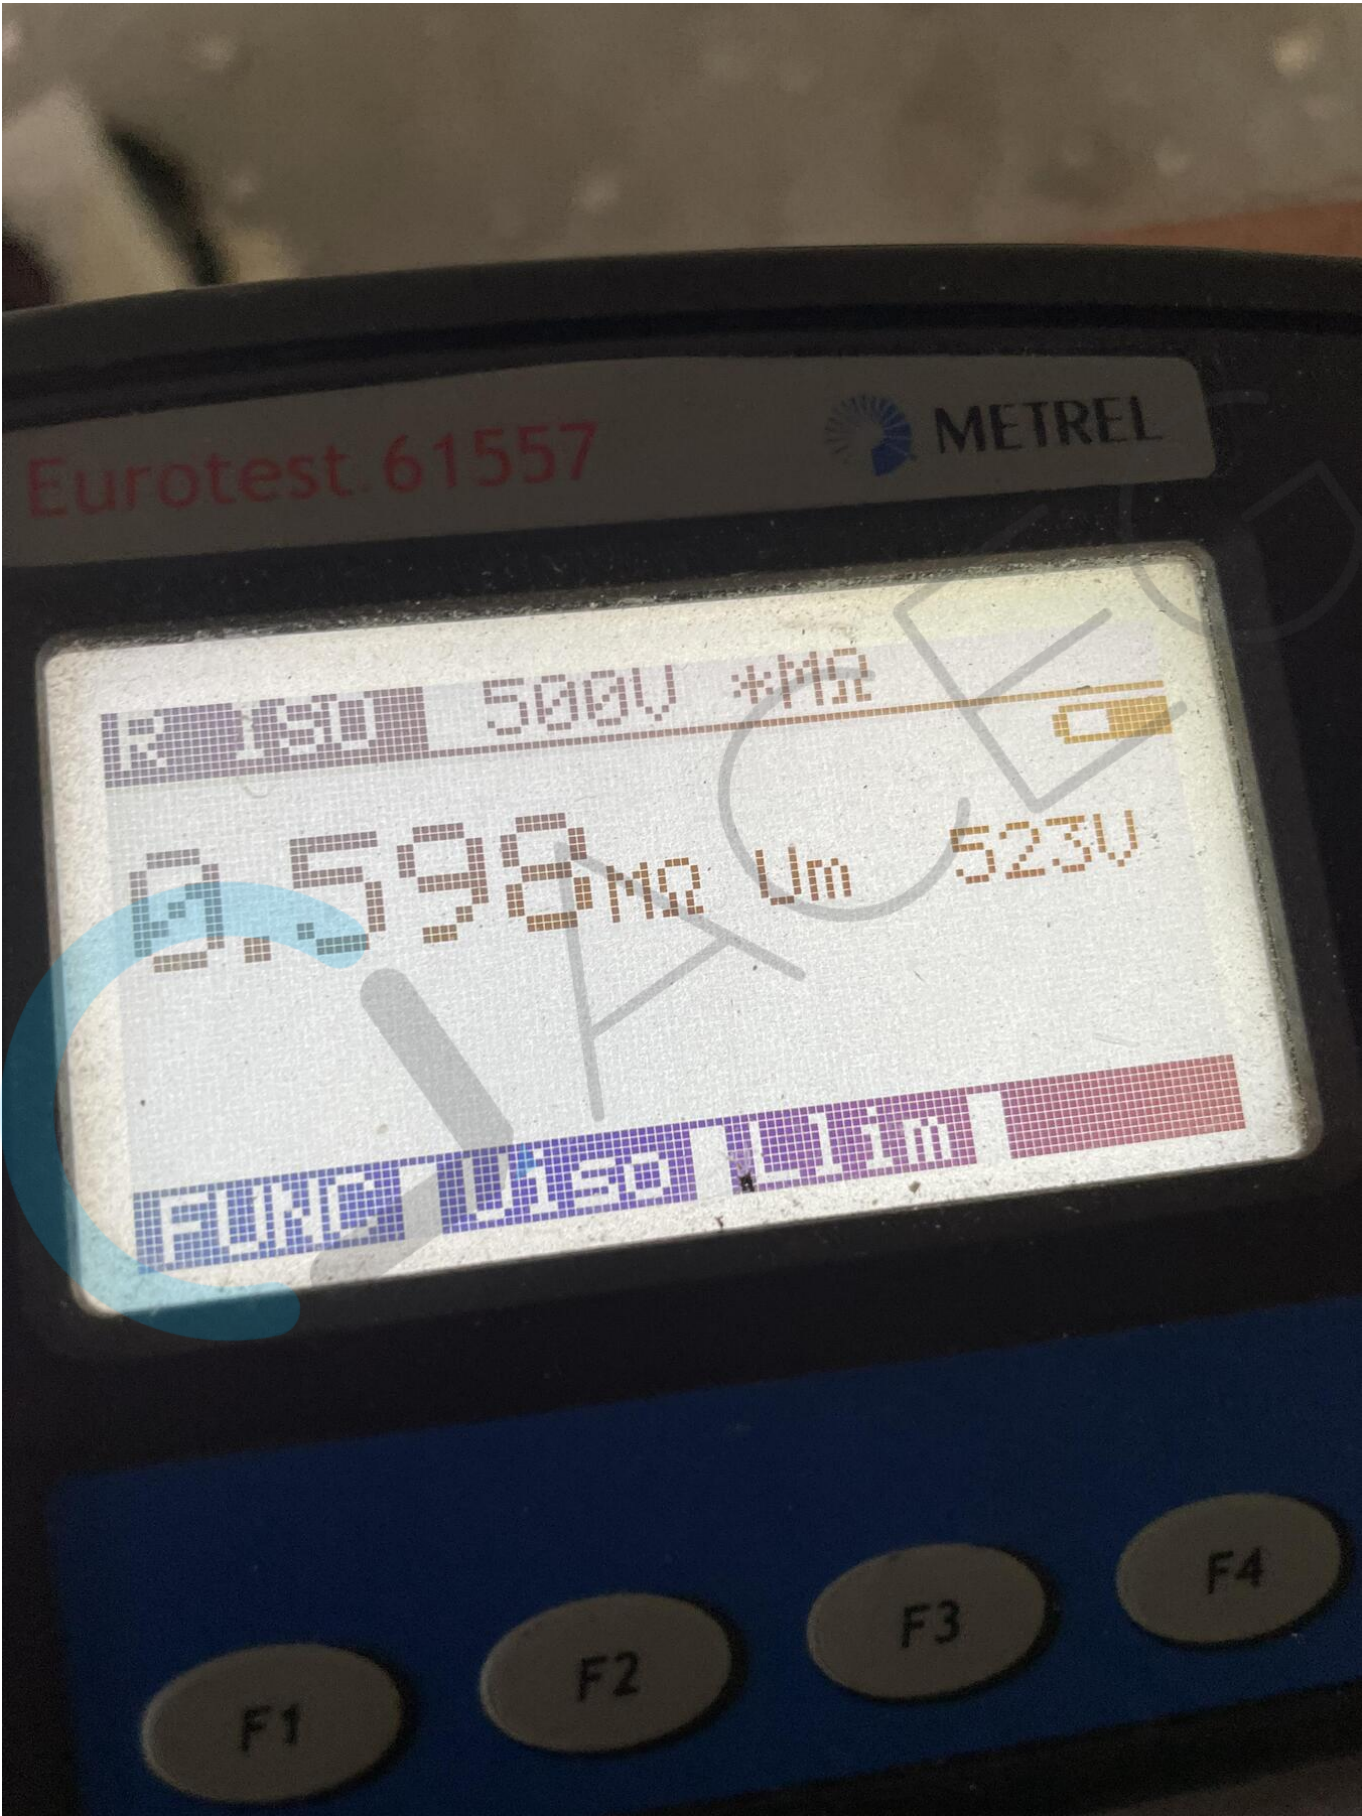

18/09/2024 erkend door: Plan-J - BTW BE 0803.849.985

Erkend Organisme

ACEG vzw - Brussel/HQ

Ringlaan 39

1853 Strombeek-Bever

Tel.: 02 880 88 90

e-mail: info@aceg.be

BE 0839.866.481 in Françoïls Steux

Plaats van de elektrische installatie

Lafaut Estate

Kortrijksesteenweg 773 Bus 001

9000 Gent

Installateur

Ver Eecke Bart

Kruisstraat 6A


8780 Oostrozebeke




p-1/4

Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

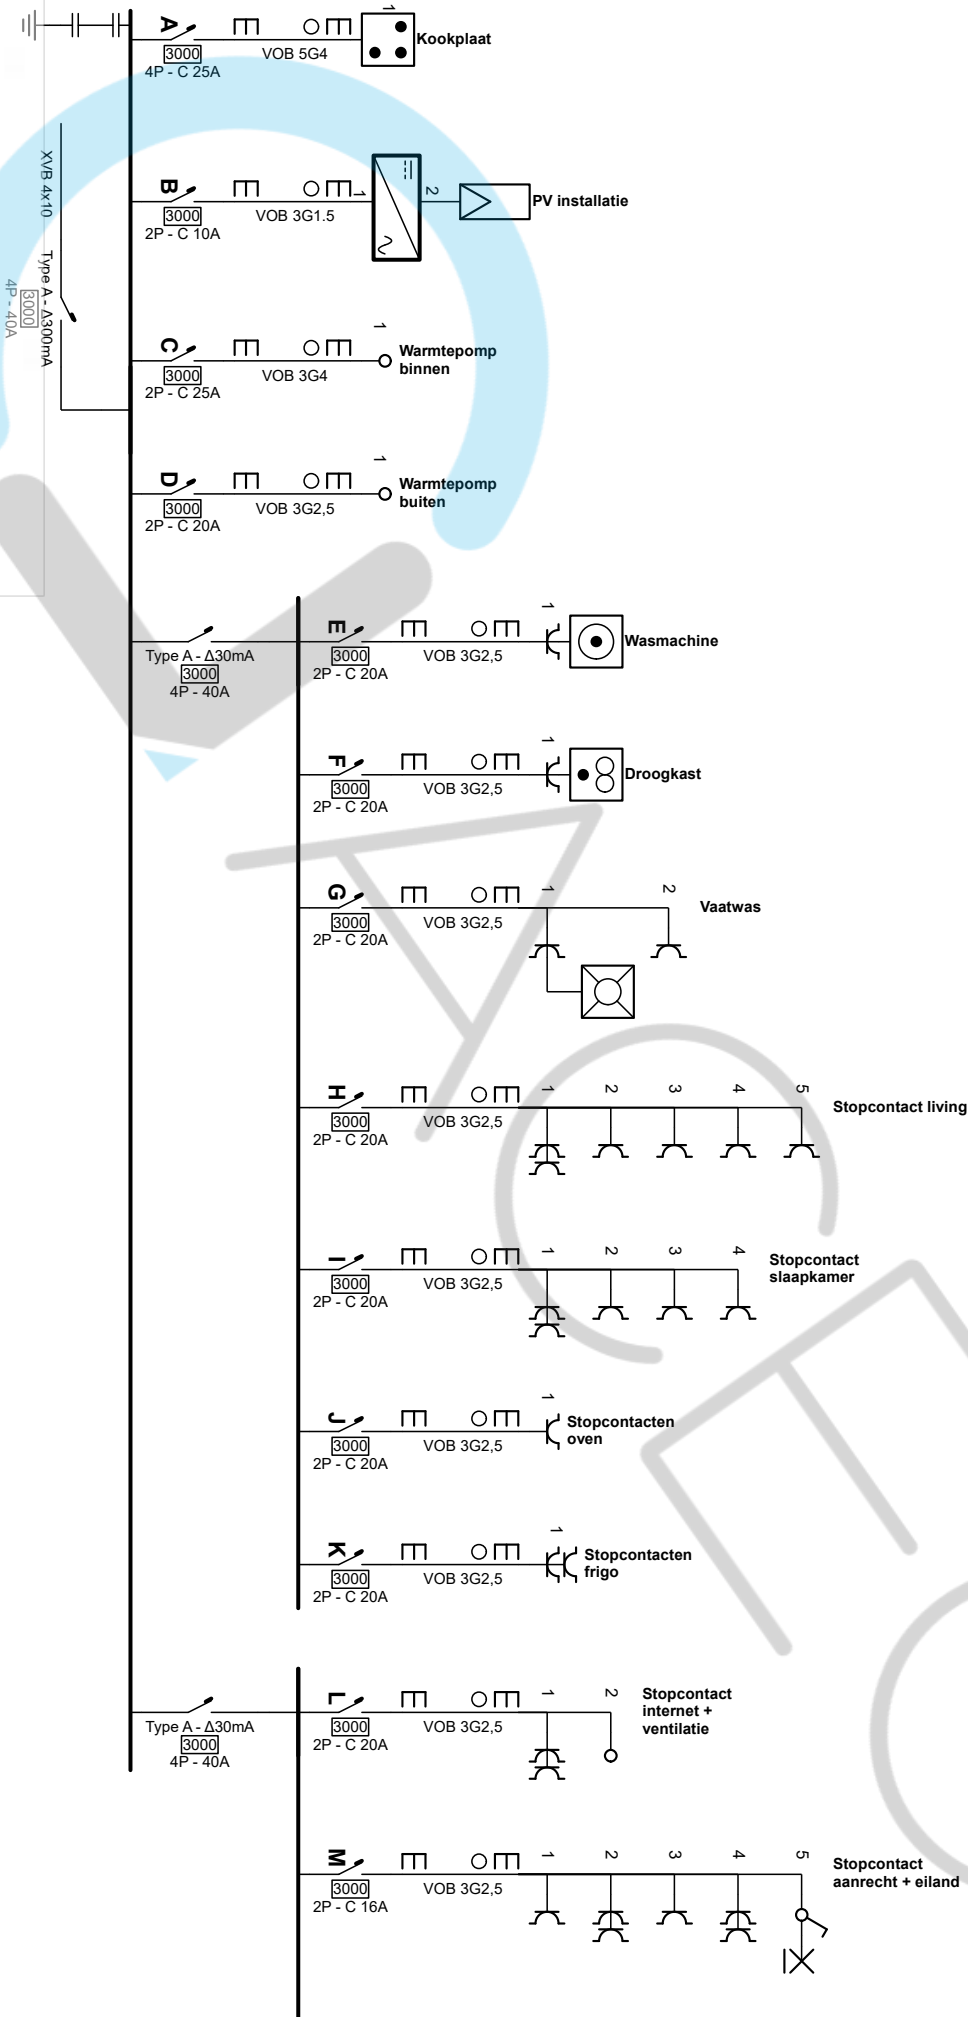

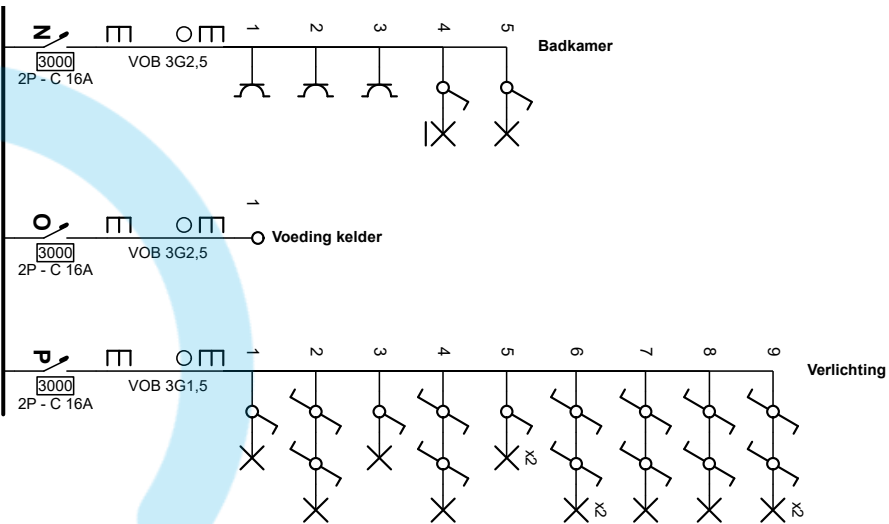

Erkend Organisme

ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481 in Françoï's Steux

18/09/2024
kend door: Plan-J - BTW BE 0803.849.985

Plaats van de elektrische installatie

Lafaut Estate
Kortrijksesteenweg 773 Bus 001
9000 Gent


Installateur

Ver Eecke Bart
Kruisstraat 6A
8780 Oostrozebeke



p. 2/4
Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

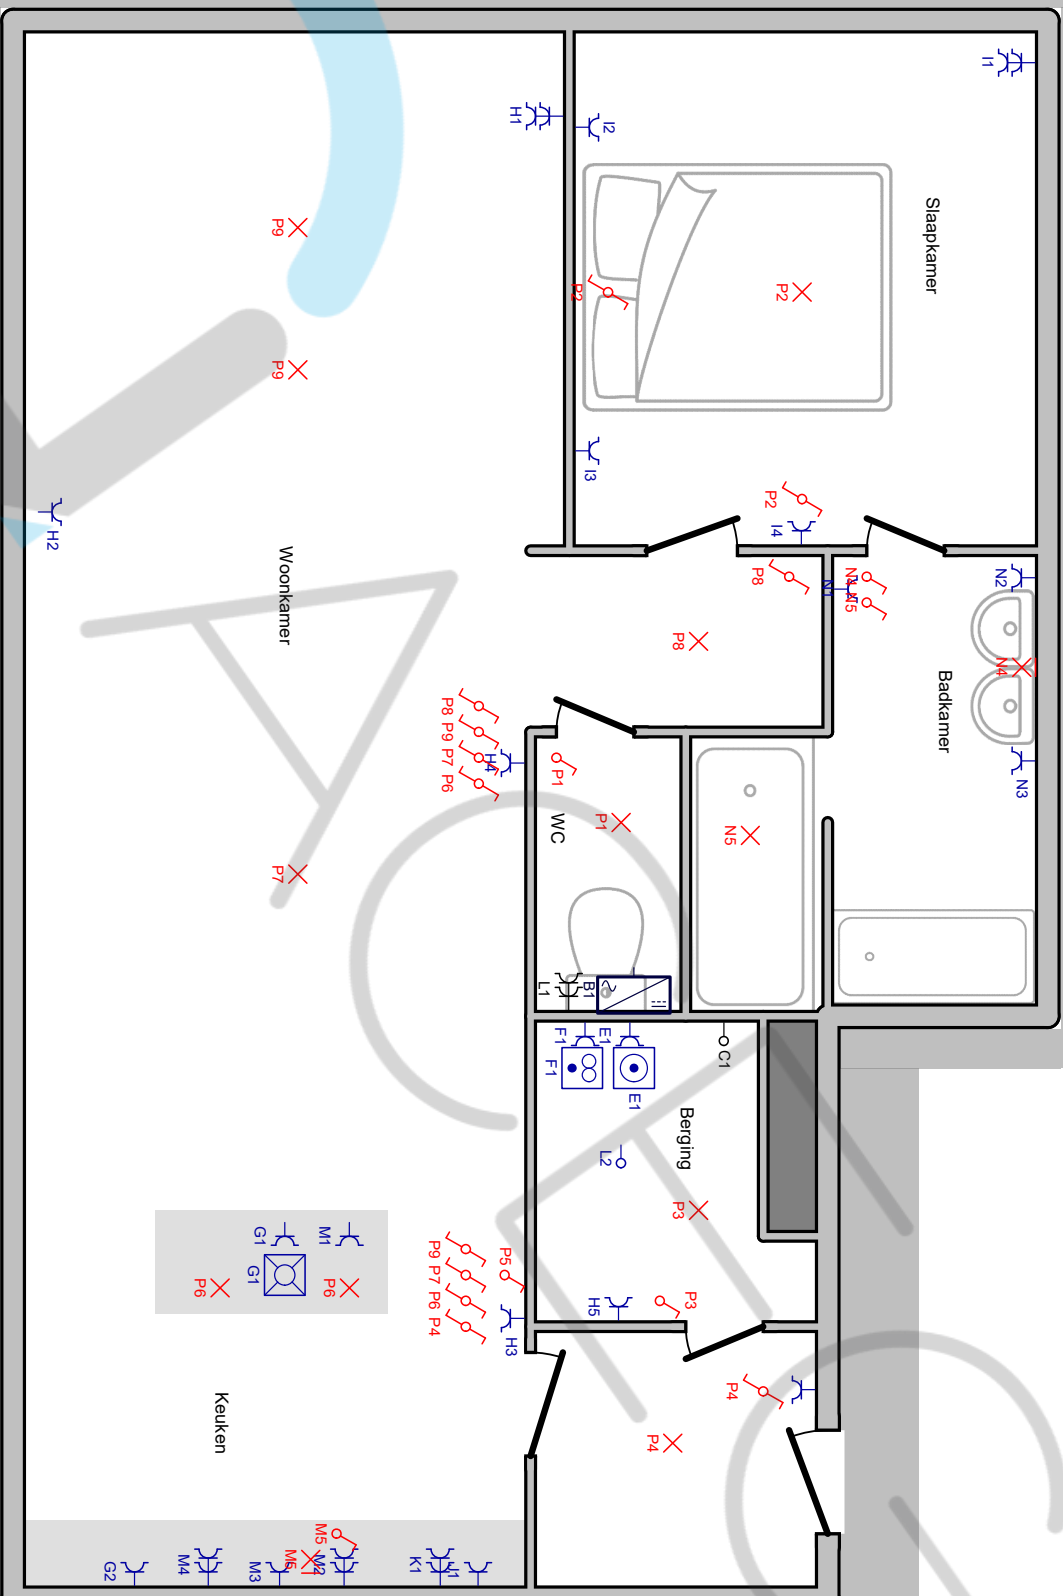

Erkend Organisme

ACEG vzw - Brussel/HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481 in Françoï's Steux

Plaats van de elektrische installatie

Lafaut Estate
Kortrijksesteenweg 773 Bus 001
9000 Gent

Installateur

Ver Eecke Bart
Kruisstraat 6A
8780 Oostrozebeke



p. 3/4
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

18/09/2024 erkend door: Plan-J - BTW BE 0803.849.985

