ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 13/06/2026 **Inspecteur:** Brahim Ichamrach **Mentor:** **Installateur:** Clement Elektrotechniek

ID-label: **Klantreferentie:**

B.T.W. nr.:BE 0888 704 496

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102 BT Serienummer: 23021928

Datum verslag: 13/06/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Floraliënlaan
Huisnummer	51
Busnummer	501
Postcode	9000
Gemeente	GENT
Land	België

Eigenaar


Naam	Rac projects
Straatnaam	Floraliënlaan
Huisnummer	51
Busnummer	501
Postcode	9000
Gemeente	GENT
Land	België

Installateur

Naam	Clement Elektrotechniek
BTW nr.	BE 0888 704 496
Telefoonnummer	0475/26 00 76
E-mail	elektrotech.clement@gmail.com

Type : appartement **EAN** : 541448820051410733 **Teller Nr.:** : 1SAG3200421048

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.


Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm^2 Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2 Aantal kringen: 11

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 23.8 MΩ RE: 15.18 Ω

OK OK





DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle kringen	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	-	3	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's	-	-		-	-

Visueel nazicht (algemeen)	OK	**Directe aanraking**	OK	**Indirecte aanraking**	OK
Aansluitingen	OK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	**Doorsnede geleiders**	OK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 13/6/2051

☑ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☑ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 10:27 tot 11:03

De inspecteur Brahim Ichamrach




Brahim Ichamrach
ACEG VZW - N305

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**	**Stap 4**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 13/6/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

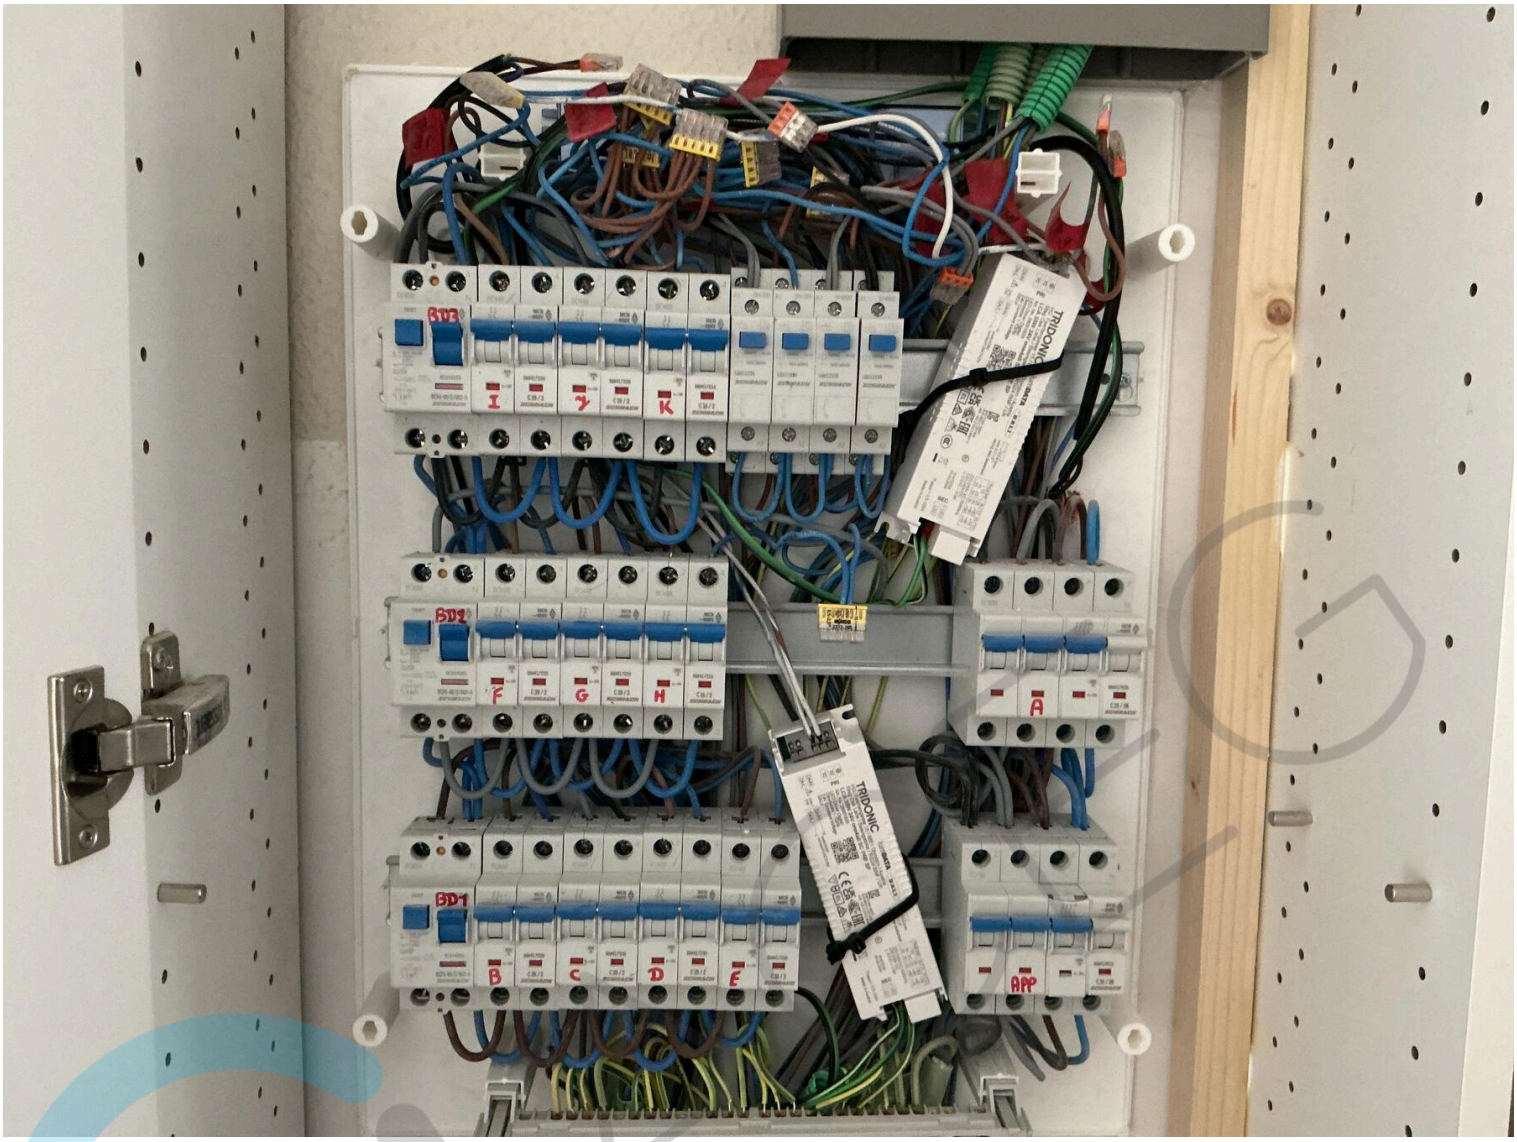
BD3
I
J
K
BD2
F
G
H
A
TRIDONIC
BD1
B
C
D
E
APP


Teco
L9-F25/3N
Onderbreking of defect 078 35 35 00
Meer weten over je meter?
SCAN QR-CODE



EAN E
5414488200514107 33
51 nr:501 20
.8.1
000000.034 kWh
L1 L2 L3 P- P+
P1 € MID NW
1.8.1
2.8.1
1.8.2
2.8.2
LTE
NB2
1SAG3200421048
3 x 230V ~ 50Hz
3 x 230 / 400 V ~ 50Hz
0,25 - 5 (100)A
-25°C / +55°C
UC3/ IP54
OVC III
kWh
B
1000 Imp/kWh
kvarh
2
1000 Imp/kvarh
Sagemcom
CS 39000
92271 BOIS-C. Cedex
FRANCE
S/N 1SAG3200421048
HW 253967035
17/2025
P1

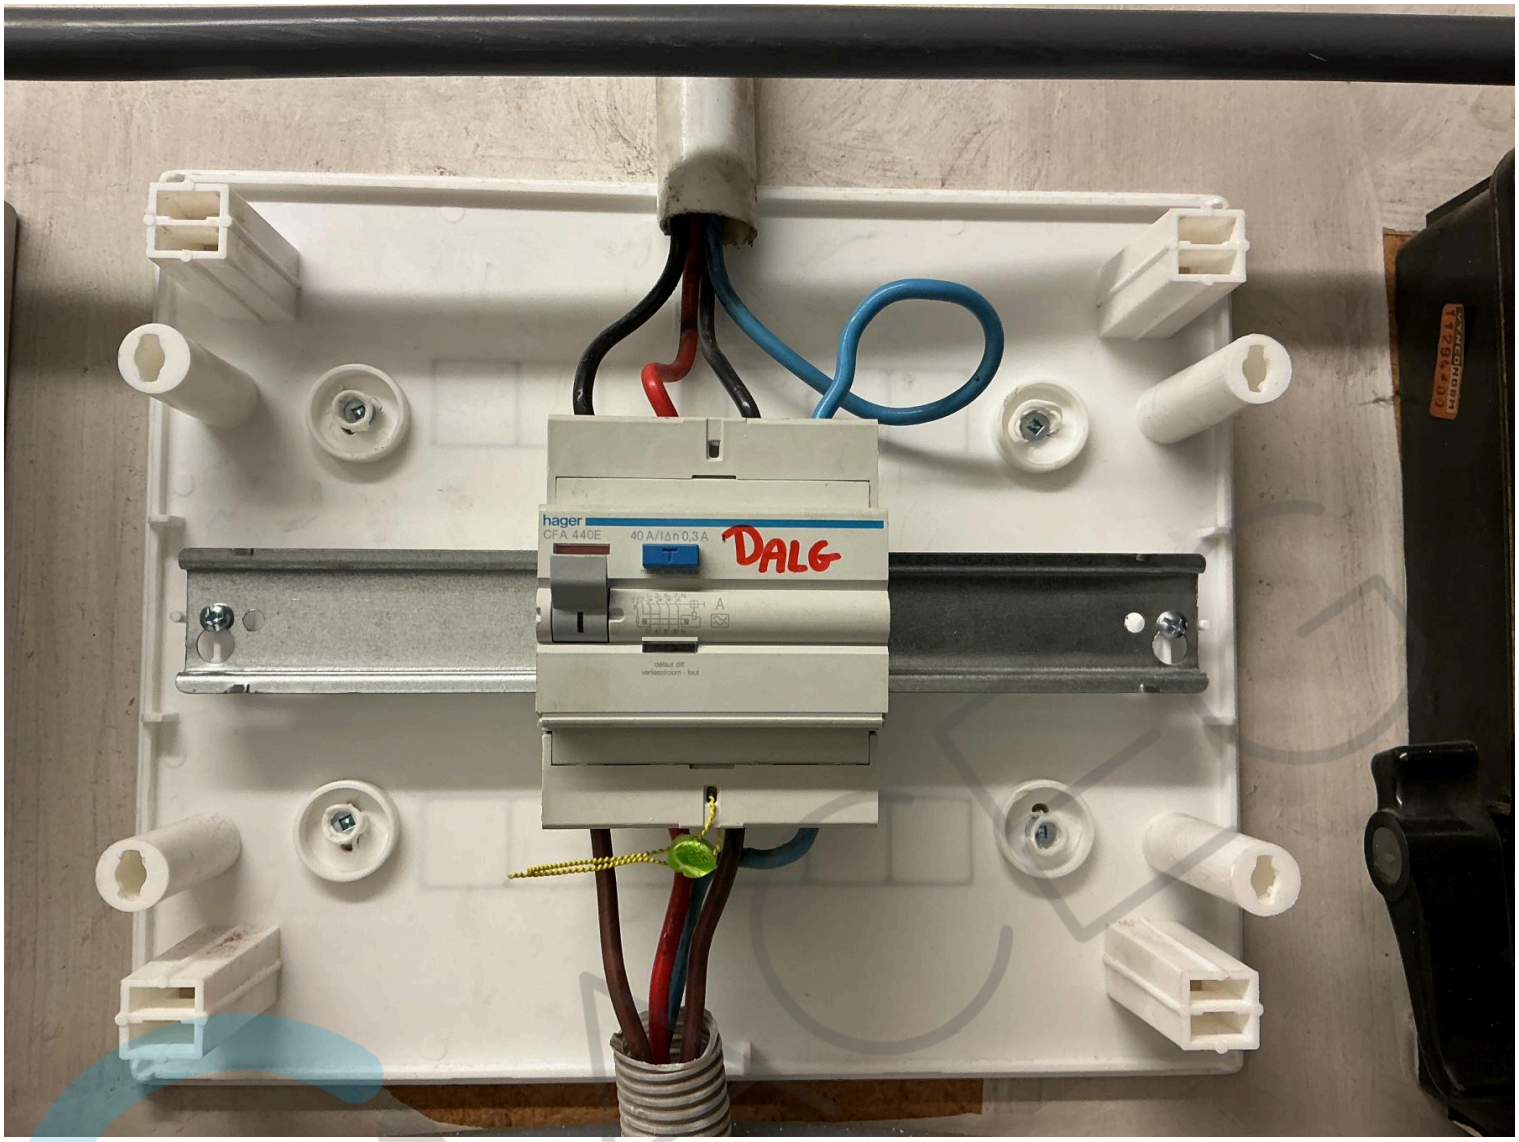
hager
CFA 440E
40 A/IΔn 0,3 A
DALG


Bord APP
3x400V+N
SCHRACK
APP


MI 3102 BT
METREL
EARTH RE
30Ω
R: 15.18Ω
Rc: 0.0kΩ
Rp: 0.0kΩ
MEM
NEXT
BACK
HELP
TEST
ESC
AUTO SEQUENCE
EurotestXE


MI 3102 BT
METREL
TEST
ESC
MEM
BACK
HELP
AUTO SEQUENCE
EurotestXE
500V 0.50MΩ
R: 23.8 MΩ
Um: 525V

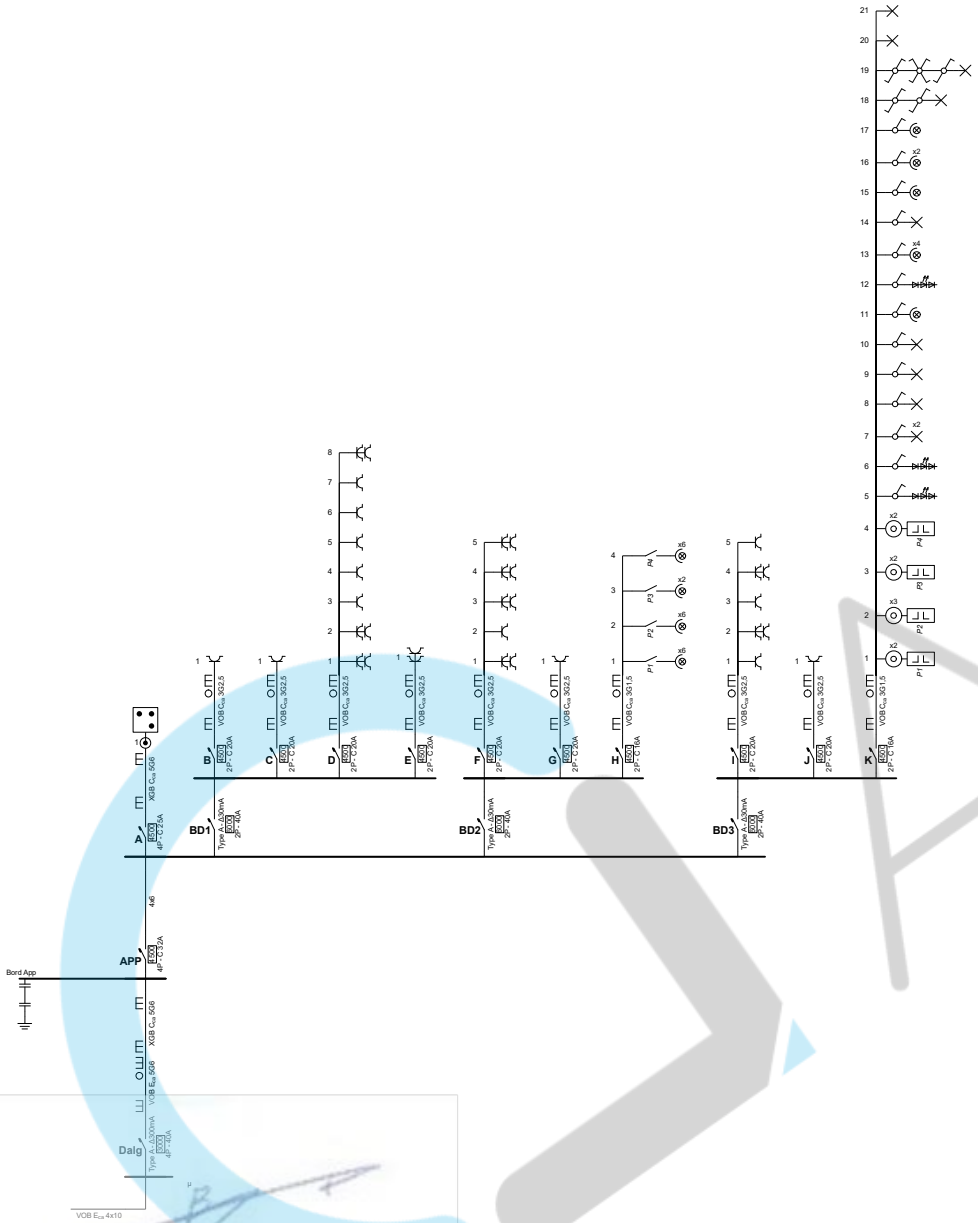

Erkend Organisme
-

Brahim Ichamrach
ACEG VZW - #305

13/06/2026


Plaats van de elektrische installatie
Rac projects
floralienlaan 51 Bus 501
9000 Gent

EAN 541448820051410733

Installateur
Electrotechniek Clement B.V.B.A.
Industriestraat 3 Bus 1
8755 Ruiselede
GSM: 0475/26.00.76
e-mail: elektrotech.clement@gmail.com
BTW BE 0888.704.496

p. 1/3
Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

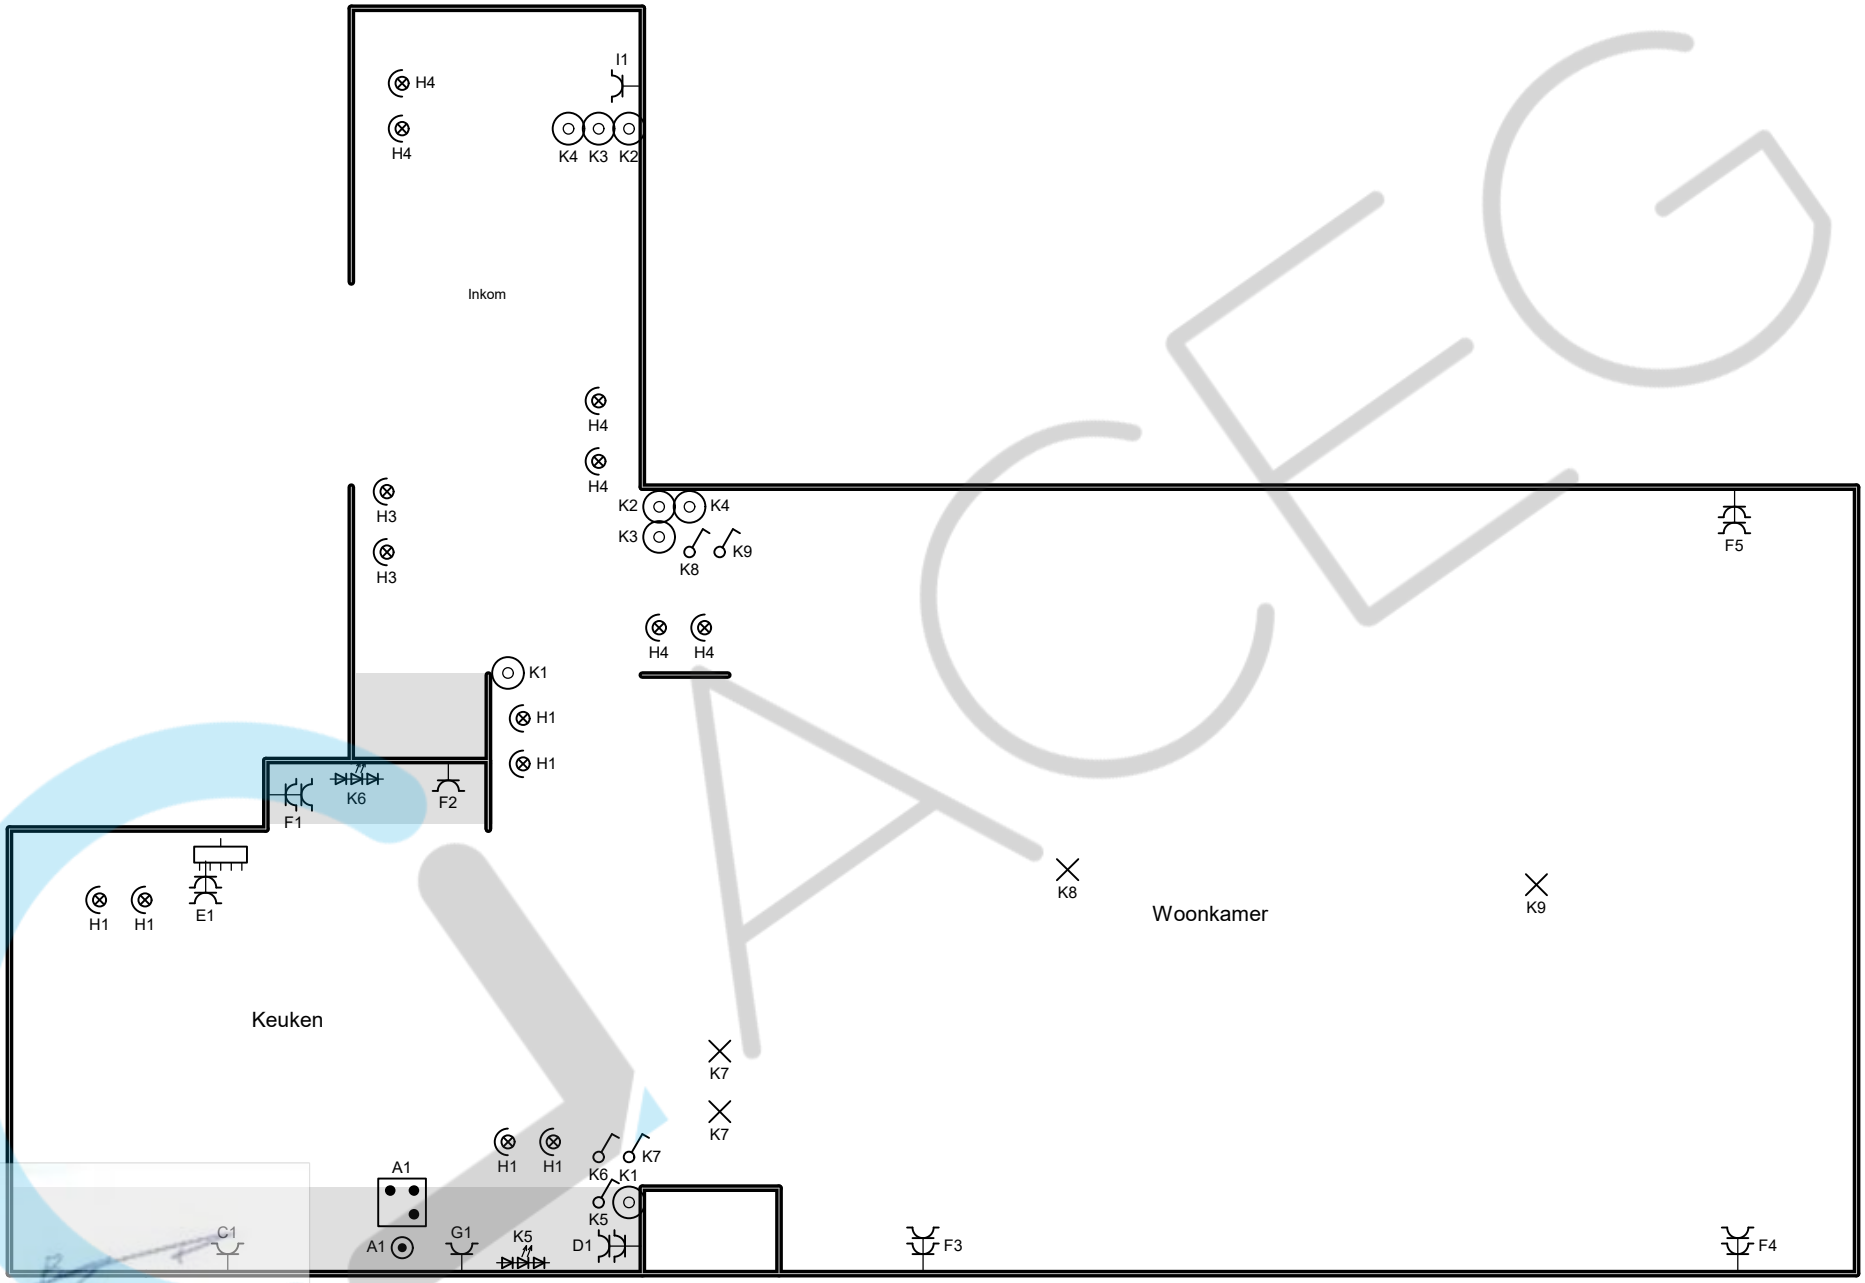

Erkend Organisme
-

Brahim Ichamrach
ACEG VZW - 9305

13/06/2026


Plaats van de elektrische installatie
Rac projects
floralienlaan 51 Bus 501
9000 Gent

EAN 541448820051410733

Installateur
Electrotechniek Clement B.V.B.A.
Industriestraat 3 Bus 1
8755 Ruiselede
GSM: 0475/26.00.76
e-mail: elektrotech.clement@gmail.com
BTW BE 0888.704.496

p. 2/3
Situatieplan

3 x 400V + N ~ 50Hz

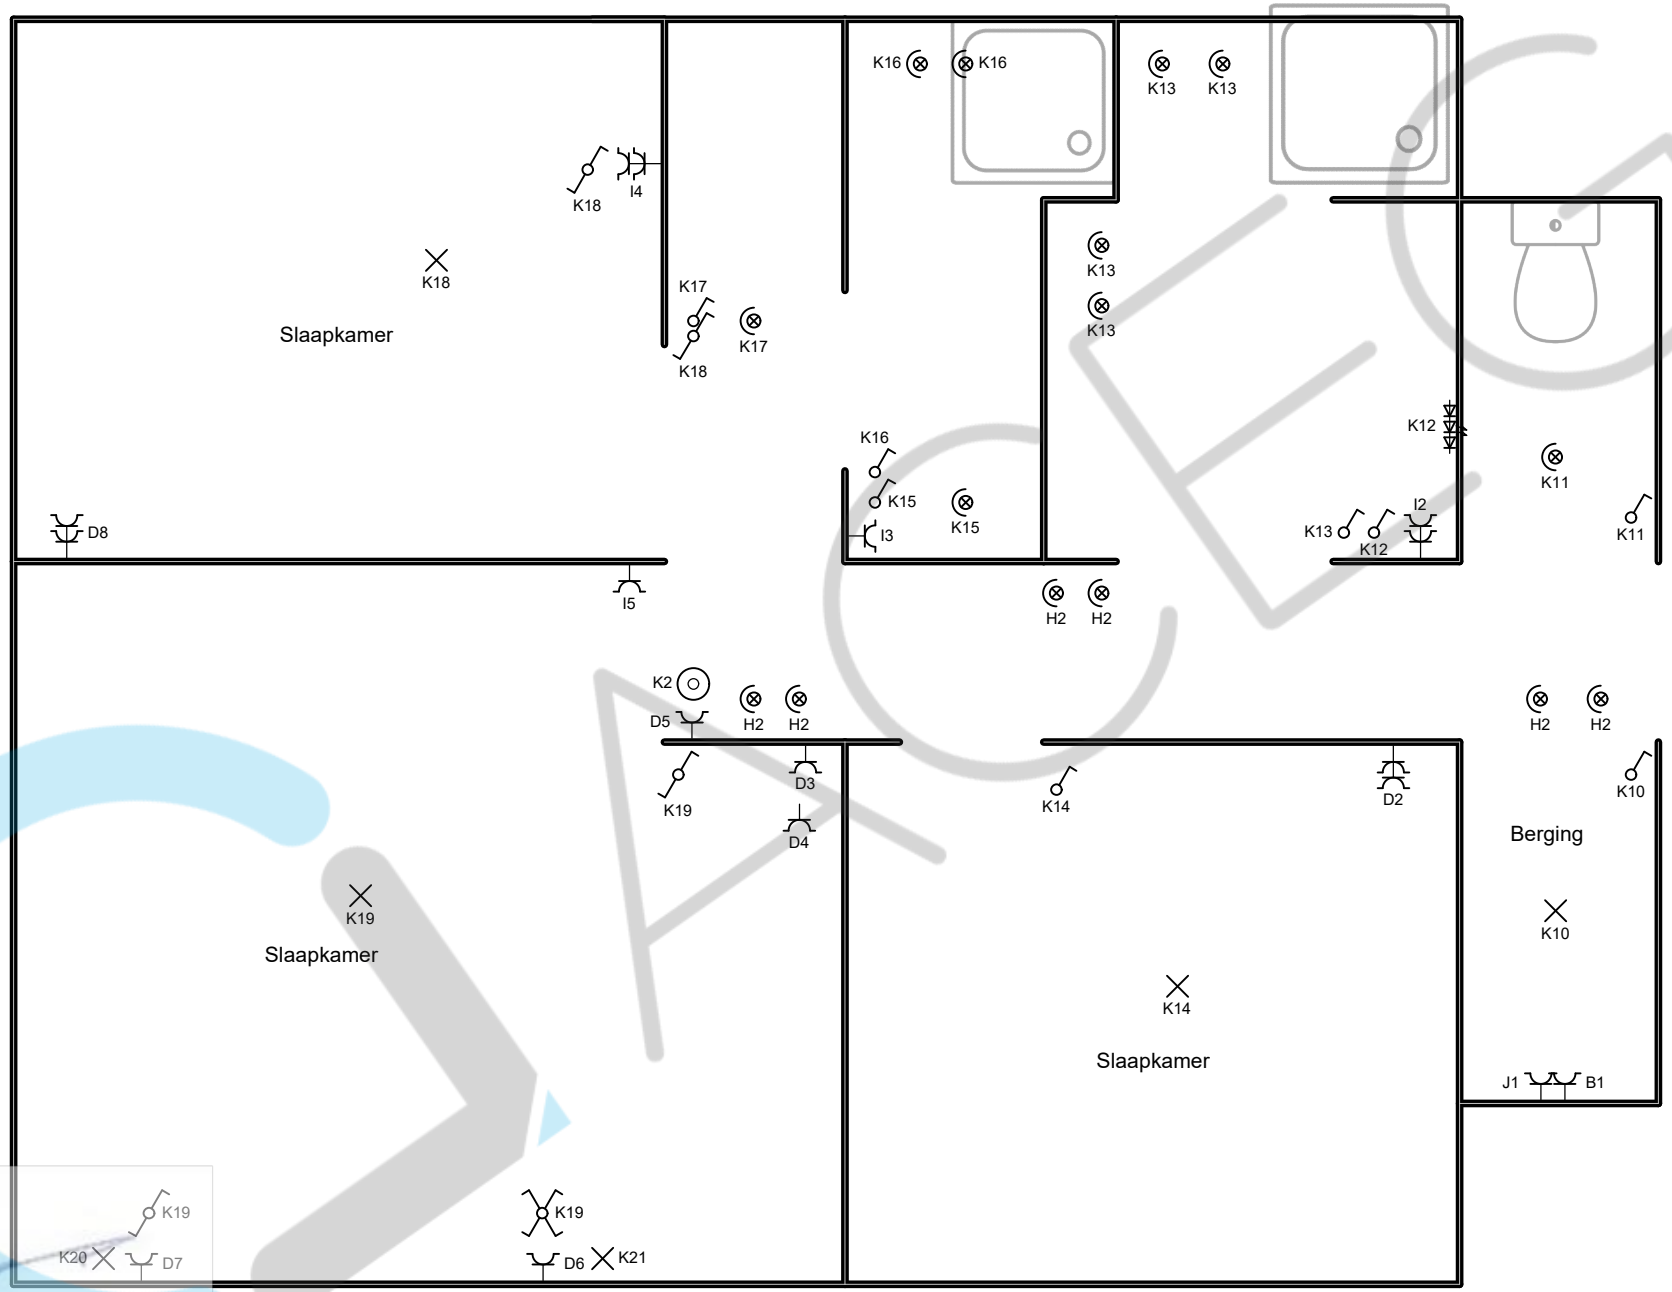

Erkend Organisme
-

Brahim Ichamrach
ACEG VZW - 1305

13/06/2026

Plaats van de elektrische installatie
Rac projects
floralienlaan 51 Bus 501
9000 Gent

EAN 541448820051410733

Installateur
Electrotechniek Clement B.V.B.A.
Industriestraat 3 Bus 1
8755 Ruiselede
GSM: 0475/26.00.76
e-mail: elektrotech.clement@gmail.com
BTW BE 0888.704.496

Situatieplan

3 x 400V + N ~ 50Hz
